



*Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement
des Eaux Usées des Bassins de la Thève et de l'Ysieux*



COMMUNE DE JAGNY SOUS BOIS



ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAUX USEES.

BILAN D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2019

COMMUNE DE JAGNY SOUS BOIS

S O M M A I R E

I - SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EU

II - TRAVAUX D'ENTRETIEN REALISES EN 2019

- a) Programme de curage et d'inspection télévisée des collecteurs eaux usées, y compris branchements particuliers
- b) Interventions d'urgence
- c) Entretien du poste de refoulement PRC14
- d) Travaux sur les réseaux
- e) Divers

III - BILAN FINANCIER 2019

ANNEXE

I – SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES

	Collecteur		
	L (ml)	Nature	D (mm)
allée Sainte-Geneviève - en rétrocession	111	G	150
CR12 de Jagny à Lassy (CV dit des chasseurs)	50	G	150
CV2 de Jagny à Luzarches	390	B	300
CV4 de Jagny à Puiseux-les-Louvres	120	AC	150
rue du chef de ville	402	AC/PVC	200
rue du gué (entre Jeanest & CV4)	177	AC	200
rue Faflot	160	AC	150
rue Jeanest (de PRC14)	240	PVC	100
rue Jeanest (en aval du refoul. du PRC14) -du 1 au 28	272	AC	200
rue Jeanest (vers PRC14) - du 21 au 50	202	AC	200

LINEAIRE TOTAL : 1 773 ml de conduite gravitaire et 240 ml de refoulement

II – TRAVAUX REALISES DURANT L'ANNEE 2019

- a) **Programme de curage et d'inspection télévisée des collecteurs eaux usées, y compris branchements particuliers**

	Curage	ITV	Curage Bts	ITV Bts
RD 47 entre Lassy et Jagny	2336			
Rue du Gué	181			
	2 517 m			

- b) **Interventions d'urgence :** néant

- c) **Entretien du poste de refoulement PRC 14**

Poste de refoulement rue Jeanest :

Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.

- **1 Passage pour pomper et nettoyer la bache du poste en *Octobre 2019***

d) Travaux sur réseaux (petites réparations) :

n° de la demande	Date de la demande	Description des travaux	Adresse	Montant HT
19-23	07-mars	Mise à niveau d'un regard de façade sous accotement enherbé	Rue Jeanest	559,00 €
19-27	19-mars	Fourniture et pose d'une vingtaine de mètres de bordures T2 (protection du poste PRC14 des engins agricoles)	rue Jeanest	1 694,52 €
19-31	03-avr.	réfection du chemin agricole au droit du poste PRC14	rue Jeanest	5 911,00 €
19-50	13-juin	reprise d'une portion de trottoir en béton désactivé présentant des fissures	24 rue Jeanest	1 842,41 €
19-59	24-juil.	Protection des trois premiers regards gravitaires (aval refoulement) contre l'H2S	Rue Jeanest	5 415,40 €
				15 422,33 €

e) Divers

e1 - Enquête de branchement : 2 unités

Le 22 mars 2019 : 10 rue Chef de Ville – maison existante, création 2^{ème} logement

Le 29 mars 2019 : 11 rue Chef de Ville – construction existante

e2 - Conformités : 10 unités dont 3 non-conformes, 3 contre visite.

	Numéro	Rue		Gratuit	N° Dossier initial	
19-24	10	Rue Chef de Ville	09-janv	CV	18--849	
19-133	4	Chemin des Chasseurs	18-févr			
19-684	4	Chemin des Chasseurs	23-juil			Eu indéterminée
19-855	1 Bis	Rue Faflot	27-août			1 grille EP dans EU
19-878	4	Chemin des Chasseurs	04-sept	CV	19-684	
19-879	4	Chemin des Chasseurs (logement)	04-sept			
19-950	17	rue Chef de Ville	24-sept			EP dans EU
19-978	1 BIS	Rue Faflot	01-oct	CV	19-855	
19-1171	15	rue Chef de Ville	26-nov			
19-1196	8	rue Faflot	05-déc			

e4 - Permis de construire et déclaration préalable : 2 unités

Demande reçue le	N°	Adresse de la construction	Objet de la demande
16-mai-19	DP 095 316 19 E0002	10 rue du chef de ville	Aménagement extérieur autour d'un bâtiment existant
30-dec-19	PC 095 316 19 E0001	10 rue du chef de ville	Aménagement d'un logement dans une grange existante

e5- Assainissement Non Collectif : Aucun contrôle réalisé en 2019

e6 - Rétrocessions et astreinte

Le **Sicteub** souhaiterait obtenir de la part de votre commune la liste des voiries privées rétrocédées dans le domaine communal afin de mettre à jour les plans des réseaux de votre commune et de ne pas oublier des collecteurs à entretenir.

Permanence, astreinte

Surveillance 7j/7j et 24h/24h pour dysfonctionnement sur le réseau de collecte des eaux usées.

Pendant les heures ouvrées : 01 34 09 85 50



En dehors des heures ouvrées : 09 77 401 119

III – BILAN FINANCIER 2019

** Les coûts mentionnés sur ce rapport, sont des coûts hors taxe et non actualisés*

	Quantité réalisée	Prix Unitaire	TOTAL
Curage des collecteurs d'eaux usées :	2 517,00	2,18	5 487,06
Curage des branchements particuliers :	0,00	14,00	0,00
Inspection télévisée des collecteurs d'eaux usées :	0,00	2,60	0,00
Inspection télévisée des branchements particuliers :	0,00	25,00	0,00
Intervention d'urgence :	0,00	235,00	0,00
Démontage et entretien des clapets anti retour :	0,00	113,10	0,00
SOUS TOTAL :			5 487,06 €
Curage et pompage du poste de refoulement PRC14	1,00	380,00	380,00
Entretien et maintenance du poste de refoulement PRC14 (forfait)	1,00	4 198,72	4 198,72
SOUS TOTAL :			4 578,72 €
Enquête de branchement	2,00	50,39	100,78
Visites de conformité	10,00	103,33	1 033,30
SOUS TOTAL :			1 134,08 €
Travaux divers, petites réparations			
SOUS TOTAL :			15 422,33 €
Cout Hors-Taxes des travaux d'entretien pour la commune de Jagny-Sous-Bois :			26 622,19 €

Annexe 1

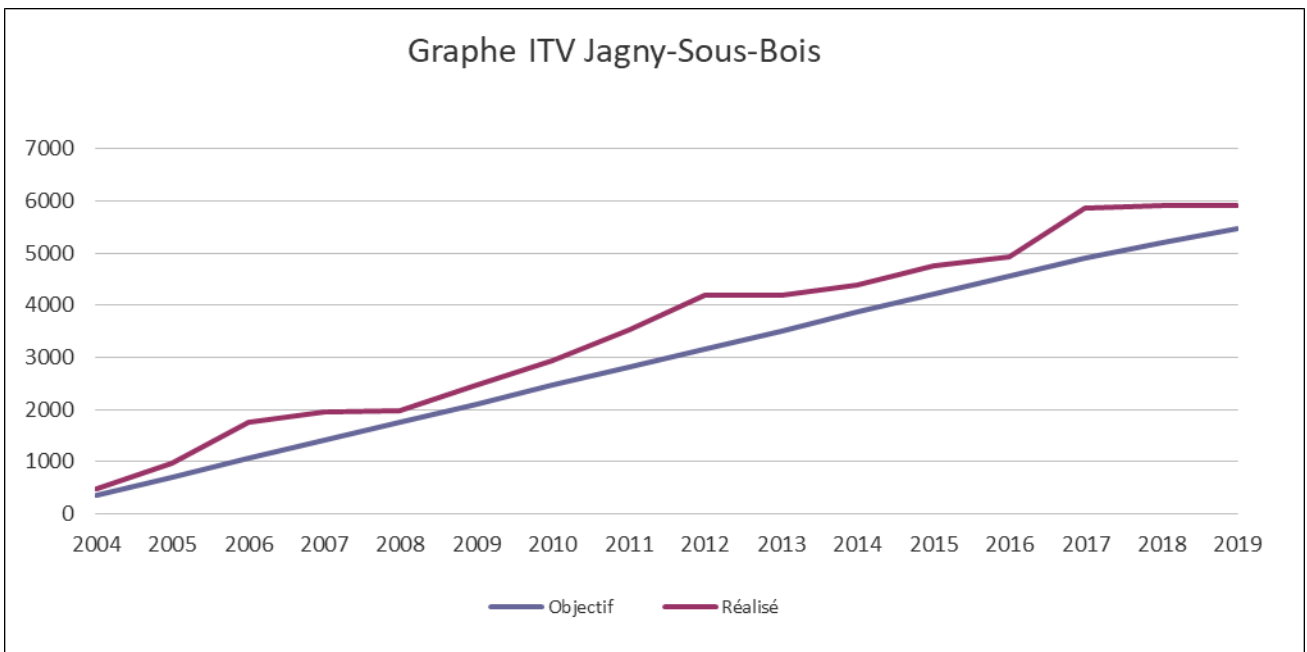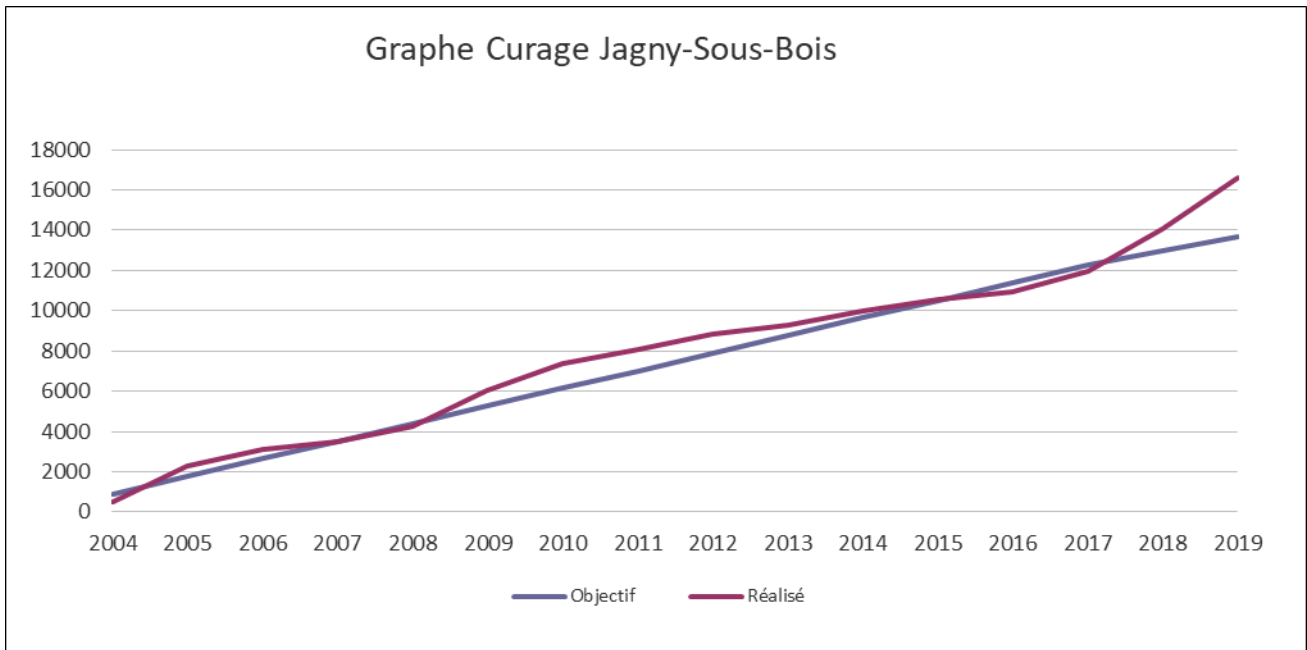

Graphe Inter d'urgence Jagny-Sous-Bois



Coût des travaux d'entretien

